KZ.T.16.2460
TESTING

Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент , мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 12.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24 – 30 от 08.01.2024 г.
Испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	08.01.2024 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг », г.Шымкент , мкр. Кайтпас -1, ул. Кахарман 12
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ИП «ORDA & BUSINESS» РК, Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. А.Мусаева 3
4	Наименование, адрес объекта	ТОО ДЕТСКИЙ ЯСЛИ САД «КЫМБАТ АПА» РК, Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Абая 38
5	Основание для проведения испытаний	Заявка №13 от 03.01.2024 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнезащитный состав «ЛАКРОН - МС»
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «ЛАКРОН - МС» ТУ 2499-001-55076036-2007
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянных конструкций кровли крыши на объекте
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, общая площадь 600 м^2 ,п.9.4.10 и11 СТ РК 615-1-2011.
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 16 °С, влажность: 64 %.
13	Результаты испытаний:	

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Образец с восточной стороны с маркировкой № 1	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.
2	Образец с восточной стороны с маркировкой № 2	
3	Образец с западной стороны с маркировкой № 3	
4	Образец с левой стороны от входа с маркировкой № 4	
5	Образец в центральной части справа с маркировкой № 5	
6	Образец в центральной части слева с маркировкой № 6	
7	Образец в дальней части от входа слева с маркировкой № 7	
8	Образец первый от входа с маркировкой № 8	
9	Образец последний от входа с маркировкой № 9	
10	Образец в центральной части с маркировкой № 10	
11	Образец в восточной стороне слева с маркировкой № 11	
12	Образец с маркировкой № 12	
13	Образец с маркировкой № 13	
14	Образец с маркировкой № 14	
15	Образец с маркировкой № 15	
16	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора.

Начальник испытательной лаборатории	(подпись)	**Исаева А.М.** (фамилия, инициалы)

№ 11/201-И от 06.02.2023

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460
от «31» января 2023 года
действителен до «31» января 2028 года

Испытательная лаборатория
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр противопожарных услуг»
город Шымкент , Енбекшинский район, 16 микрорайон, 6 дом , 36 квартира

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя органа по аккредитации **Н. Шокбарбаев**

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Данный электронный документ DOC ID KZADPA220231001863O8ADCBF5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке [illegible]

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11.201-И от 06.02.2023 г.
Организация/отправитель	РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Получатель (-и)	ИЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ»
	Г. ШЫМКЕНТ (IP.ALAN@MAIL.RU)
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Время подписи: 03.02.2023 18:50
	Согласовано: Время подписи: 06.02.2023 10:57
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Сертификат: ШОКБАРБАЕВ НУРЛАН MIIWIQYJ...BxaC2Lw== Время подписи: 06.02.2023 16:22
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭЦП канцелярии: АБЫЛОВА МӘНШУК MIIW7gYJ...coXtxHox9 Время подписи: 06.02.2023 16:27

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД Documentolog 7.17.2. Положительный результат проверки ЭЦП

1	2	3	4	5	6	7
				-ограждений марша и площадки маршевой лестницы	горизонтальной нагрузки	
				Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.9
4	3402 11	Пенообразователи	СТ РК 1608-2006	-внешний вид	Визуальный	СТ РК 1609-2014, п.7.3.1
5	8544 49 910 8544 49 950 8544 49 990	Кабели, провода и шнуры	ГОСТ 24334-80 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 10348-80	-сопротивление изоляции	Измерения при напряжений от 100 до 1000 В	ГОСТ 3345-76
6	3544 19	Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 1798-2008	-определение качества и толщины огнезащитного покрытия	Визуальный осмотр, линейные измерения	СТ РК 1797-2008, п.6.2.1
7	6806 10 0008	Материалы и изделия строительные противопожарные, теплоизоляционные и звукоизоляционные, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси	ТР РК №1202 от 17.11.2010 г *(с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.).* ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 17177-94	-внешний вид изделия -определение плотности	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	ГОСТ 17177-94, п.5 ГОСТ 17177-94, п.5

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат про

ТОО «Центр противопожарных услуг»	Область аккредитации	Страница 1 из 3

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»

Фактический адрес: Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон, 6 дом , кв.36

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6	7
1	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные. - для древесины и материалов на ее основе	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-1-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Метод воздействия пламенной горелки	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные. - для стальных конструкций	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 615-2-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Визуальный метод, измерения толщины.	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
				-эффективность огнезащитного средства	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
3	7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные	ТР № 405 - Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки

Договор №001/01/24

с.Темирлан **05.01.2024**

ТОО Детский ясли-сад «Кымбат апа»
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» БИН 150940020432, в лице директора Капслямов Берик Ауесханулы., действующей на основании устава с одной стороны и ИП "ORDA & BUSINESS" именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице **директора Альназарова А.Н.** ,действующего на основании талона, с другой стороны заключили договор о закупках (далее договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ», принимает на себя выполнение работ.

1.2.**Техническое обслуживание пожарной,сигнализации и обработка древесины**

1.3.Общая сумма договора составляет 200000 (двести тысяч) тенге 00 тиын.

2.Условия договора

2.1.Исполнитель выполняет услугу.

2.2.Место исполнения обязательств по договору: Туркестанская область, Ордабасынский район, с Темирлановка, ул Абая 38.

2.3.В ходе исполнение обязательств по данному договору, стороны при необходимости имеют возможность предоставлять информацию о результатах исполнение обязательств с оформлением промежуточных актов-сверок.

3.Ответственность сторон

3.1.Стороны несут ответственность за неисполнение договора по действующему законодательству РК.

3.2.Исполнитель несет ответственность за качественное , своевременное установка пожарной сигнализации.

3.3. В случае ненадлежащего исполнение условий договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ», выплачивает пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки ,с перечислением на расчетный счет Заказчика

3.4.В случае просрочки платежей «ЗАКАЗЧИК», уплачивает пеню в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки

3.5.Все споры и разногласия, возникшие в процессе выполнение условий данного договора, решаются сторонами и оформляются двусторонними соглашениями. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий, стороны оформляют свои претензии через арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

3.6. Стороны имеют право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при наличии явных нарушений сторонами выполнения условий данного договора с письменным уведомлением другой стороны в срок не позднее 15 дней, предшествующих отказу.

3.7. Все взаимоотношения, не урегулированные настоящим договором , регламентируются действующим Законодательством РК.

4. Платеж

4.1. Оплата за поставленный услугу производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее до 31.02.2024 с даты подписания Сторонами акта приема-передачи услуга. Предоплата 50% от суммы, после подписания договора остальная сумма по исполнению, согласно акта выполненных работ остальные 50% перечислением на расчетный счет «Поставщика» в течение до 31.03.2024 года после поставки.

5. Порядок приема и оплаты

5.1. Результаты исполнения обязательств принимаются представителями Сторон с момента полного и надлежащего исполнения своих обязательств Исполнителем и оформляются актом выполненных работ.

5.2.Оплата производится согласно акту выполненных работ Исполнителем безналичным рассчетом .

5.3.Сроки и объемы выполнения работ соответствуют равномерности исполнения обязательств Заказчиком, определяются индивидуальными планами по обязательствам и по платежам в пределах выделенного финансирования.

6. Права и обязанности сторон.

6.1.Заказчик и его персонал обязаны выполнять указания и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранения оборудования.

6.2. Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу обслуживаемого оборудование.

6.3. Исполнитель обязан выполнять работу по настоящему договору. Все работы производится в рабочее время, на рабочем месте Заказчика в присутствии представителя Заказчика.

6.4.После извещения Заказчика о поломке оборудования или сбоя в программе оборудования, Исполнитель обязан осмотреть его в течение 2-х рабочих дней.

7. Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное невыполнение обязательств по настоящему договору ,если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение , военные действия, при условии, что данное обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условия по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8. **Срок действия договора**

8.1 Настоящий договор действует до 04.01.2025.

8.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, один Исполнителю, другой Заказчику, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Прочие условия.

9.1.Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если он совершен в письменной форме и подписан договаривающимися сторонами.

Юридические адреса сторон.

Заказчик:
ТОО детский ясли сад «Кымбат апа»
БИН 150940020432
Туркестанская область, Ордабасынский район,
с.Темирлановка ул Абая 38
КБЕ 17
АО «Казпочта»
ИИК KZ70563X350000081480- KZT
БИК :KPSTKZKA
Директор Капсламов Б.А..

М.П.

Исполнитель:
ИП «ORDA & BUSINESS»
РК,Туркестанская область
с Темирлановка ул А.Мусаева 3.
БИН:900509400864
ИИК: KZ54563X350000161114
БИК :KPSTKZKA
АО«Казпочта»
Директор Альназарова А

М.П.

Договор №008/01/24

с.Темирлан **05.01.2024**

ТОО Детский ясли-сад «Кымбат апа»
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» БИН 150940020432, в лице директора Капслямов Берик Ауесханулы., действующей на основании устава с одной стороны и ИП "ORDA & BUSINESS" именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице **директора Альназарова А.Н.** ,действующего на основании талона, с другой стороны заключили договор о закупках (далее договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ», принимает на себя выполнение работ.

1.2.**Установка аппарат РОКОТ-3-1 штук.**

1.3.Общая сумма договора составляет 50000 (пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

2.Условия договора

2.1.Исполнитель выполняет услугу.

2.2.Место исполнения обязательств по договору: Туркестанская область, Ордабасынский район, с Темирлановка, ул Абая 38.

2.3.В ходе исполнение обязательств по данному договору, стороны при необходимости имеют возможность предоставлять информацию о результатах исполнение обязательств с оформлением промежуточных актов-сверок.

3.Ответственность сторон

3.1.Стороны несут ответственность за неисполнение договора по действующему законодательству РК.

3.2.Исполнитель несет ответственность за качественное , своевременное установка пожарной сигнализации.

3.3. В случае ненадлежащего исполнение условий договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ», выплачивает пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки ,с перечислением на расчетный счет Заказчика

3.4.В случае просрочки платежей «ЗАКАЗЧИК», уплачивает пеню в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки

3.5.Все споры и разногласия, возникшие в процессе выполнение условий данного договора, решаются сторонами и оформляются двусторонними соглашениями. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий, стороны оформляют свои претензии через арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

3.6. Стороны имеют право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при наличии явных нарушений сторонами выполнения условий данного договора с письменным уведомлением другой стороны в срок не позднее 15 дней, предшествующих отказу.

3.7. Все взаимоотношения, не урегулированные настоящим договором , регламентируются действующим Законодательством РК.

4. Платеж

4.1. Оплата за поставленный услугу производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее до 31.02.2024 с даты подписания Сторонами акта приема-передачи услуга. Предоплата 50% от суммы, после подписания договора остальная сумма по исполнению, согласно акта выполненных работ остальные 50% перечислением на расчетный счет «Поставщика» в течение до 31.03.2024 года после поставки.

5. Порядок приема и оплаты

5.1. Результаты исполнения обязательств принимаются представителями Сторон с момента полного и надлежащего исполнения своих обязательств Исполнителем и оформляются актом выполненных работ.

5.2.Оплата производится согласно акту выполненных работ Исполнителем безналичным рассчетом .

5.3.Сроки и объемы выполнения работ соответствуют равномерности исполнения обязательств Заказчиком, определяются индивидуальными планами по обязательствам и по платежам в пределах выделенного финансирования.

6. Права и обязанности сторон.

6.1.Заказчик и его персонал обязаны выполнять указания и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранения оборудования.

6.2. Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу обслуживаемого оборудование.

6.3. Исполнитель обязан выполнять работу по настоящему договору. Все работы производится в рабочее время, на рабочем месте Заказчика в присутствии представителя Заказчика.

6.4.После извещения Заказчика о поломке оборудования или сбоя в программе оборудования, Исполнитель обязан осмотреть его в течение 2-х рабочих дней.

7. Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное невыполнение обязательств по настоящему договору ,если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение , военные действия, при условии, что данное обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условия по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8. Срок действия договора

8.1 Настоящий договор действует до 04.01.2025.

8.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, один Исполнителю, другой Заказчику, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Прочие условия.

9.1.Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если он совершен в письменной форме и подписан договаривающимися сторонами.

Юридические адреса сторон.

Заказчик:
ТОО детский ясли сад «Кымбат апа»
БИН 150940020432
Туркестанская область, Ордабасынский район,
с.Темирлановка ул Абая 38
КБЕ 17
АО «Казпочта»
ИИК KZ70563X350000081480 KZT
БИК :KPSTKZKA
Директор._____Капслямов Б.А..

М.П.

Исполнитель:
ИП «ORDA & BUSINESS»
РК,Туркестанская область
с Темирлановка ул А.Мусаева 3.
БИН:900509400864
ИИК :KZ54563X350000161114
БИК :KPSTKZKA
АО«Казпочта»
Директор_____Альназарова А

М.П.

АКТ

Приемки выполненных работ по техническому обслуживании пожарной сигнализации и проверки работоспособности пожарной сигнализации

с.Темирлановка «05»01.2024г

Комиссия в составе: ТОО ясли-сад «Кымбат апа» директор-Капслямов Б.А.

Исполнитель-ИП «ORDA & BUSINESS» Директор –Альназарова А.Н.

Заказчик- ТОО ясли-сад «Кымбат апа» директор-Капслямов Б.А.

Составили настоящий акт в том, что система пожарной сигнализации в помещениях ТОО ясли-сад «Кымбат апа», расположенного по адресу Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ул АБАЯ 38, находится в работоспособном состоянии.
Все работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводятся ИП «ORDA & BUSINESS» в соответствии с договором №001/01/24 от 05.01.2024 г.

Гарантийный срок технической пожарной сигнализации 1 год.

Акт составлен в 2-х экземплярах,один для заказчика второй для исполнителя.
Работы выполнены полностью.Претензий со стороны «Заказчика»нет.

Работу приняли:
Представители Заказчика:

Директор: _____ Капслямов Б.А..
МП

Работу сдал:
Представитель Подрядчика

Директор ИП «ORDA & BUSINESS»_____Альназарова А.Н.

МП

АКТ

Приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения

«05».01.2024г.

с.Темирлановка

Комиссия в составе ;

Представители Заказчика: ТОО ясли-сад «Кымбат апа» директор-Капслямов Б.А.

Представитель Подрядчика: "ORDA & BUSINESS" Директор-Альназарова А.Н

Составили настоящий акт о том,что соответствии с договором от №001/01/24 05 января 2024 года произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания ТОО ясли-сад «Кымбат апа», расположенное по адресу: Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ул Абая 38.

-Огнезащитный состав «Лакрон-МС» не меняет цвет древесины Каракум 24 , **и сделали следующие заключения;**

-Водный раствор готовится растворением порошка в воде соотношении 1;2.5 (одна часть порошка и две с половины части воды).

-Метод поверхностной пропитки заключеатся в нанесении распылителем пропиточного составе на деревянную конструкцию.

-Влажность обработанных деревянных конструкции составляет -15%

-Температурный режим при проведении работ -15С до +15С.

-Расход поршкообразного состава -150г/м.кв.

-Огнезащитный пропиточный состав «Лакрон-МС» нанесен на деревяенные конструкции общей плодью- 600 м.кв.

Гарантийный срок действия огнезащитного покрытия 1 год.

Проверка деревянных конструкции на огнезащищенность:

Были отобраны три пропитанных образца древесины и проведены питания.

В результате испытания было установлено,что качество огнезащитной пропитки Соответствует требованием «О техническом регулировании.Требовании пожарной безопасности к содержанию здании,сооружении и строении».

Акт составлен в 2-х экземплярах,один для заказчика второй для исполнителя.

Работы выполнены полностью.Претензий со стороны «Заказчика»нет.

Работу приняли;

Представители Заказчика;

Директор:

ТОО ясли-сад «Кымбат апа» _____ Капслямов Б.А.

МП

Работу сдал;

Представитель Подрядчика

Директор ИП «ORDA & BUSINESS» _____ Альназарова А.Н.

МП

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ТОО детский ясли- сад "Кымбат апа"
РК,Туркестанская область, Ордабасынский район,с Темирлановка ул Абая 38.

150940020432

Заказчик _____
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИП «ORDA & BUSINESS»
Исполнитель **РК,Туркестанская область, Ордабасынский район,с Темирлановка ул А.Мусаева 3.**

900509400864

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №001/01/24 от 05.01.2024г.

Номер документа	Дата составлени
1	08.01.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации,обработка древесины .			услуга	1	200 000,00	200 000,00
				Итого		x	200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Альназарова А.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор _____ / Капсламов Б.А
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

150940020432

ТОО детский ясли сад "Кымбат апа"
РК,Туркестанская область, Ордабасынский район, с Темирлановка ул Абая 38

Заказчик
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

900509400864

ИП «ORDA & BUSINESS»
РК,Туркестанская область, Ордабасынский район,с Темирлановка ул А.Мусаева 3.

Исполнитель
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №008/01/24 от 05.01.2024г.

Номер документа	Дата составлени
8	08.01.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Установка аппарат РОКОТ-3- 1 штук			услуга	1	50 000,00	50 000,00
				Итого		x	50 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Альназарова А.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор _____ / Капсламов Б.А
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 5
к Правилам обучения работников
организаций и населения мерам
пожарной безопасности и требования
к содержанию учебных програм
по обучению мерам пожарной безопасности

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Думан-Мастер» оқу орталығы
Товарищества с ограниченной ответственности «Думан-Мастер»
Протокол №004/24

Өрт техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі саласында білім тексеру бойынша біліктілік куәлігі
заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

№01 «05» қаңтар 2024 ж Бұйрығына сәйкес
В соответствии приказом №01 «05»января 2024 г
Комиссия төрайымы : Есеналиева З.А. - «Думан-Мастер» ЖШС директоры
(руководитель учебного центра ТОО Думан-Мастер)
Председатель комиссии:
Комиссия мүшелері:
Альназарова А.Н- ұйымдастырушы(организатор)
Шекербеков А – оқытушы (предподаватель)
«05»қаңтар 2024 ж аралығында Өрт техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі саласында білім тексеру бойынша біліктілік нәтижесі:
Провели проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установили следующие результаты :

№	Тыңдаушының аты-жөні ФИО	Жұмыс орны (место работы)	Лауазымы (Должность)	Билет номері билет номера	Сынақ тапсырғандығы туралы белгі(метка о сдаче зачета)
1	Исмайлова Ғ.А.	ТОО ясли сад «Кымбат апа»	заведующая	1	тапсырды
2	Сапарова Г.Е.	ТОО ясли сад «Кымбат апа»	зам.директора по хозяйственной части	4	тапсырды

Комиссия мүшелері: _____ Есеналиева З.А
(Председатель комиссии:)

Комиссия мүшелері: Шекербеков А
(члены комиссии) _____

Комиссия мүшелері
(члены комиссии) _____ Альназарова А.Н

МП

"Думан-Мастер"ЖШС
Оқуорталығы/Учебныйцентр
ТОО"Думан-Мастер"

Біліктілік куәлігі/Удостоверение 00124-8

Исмойлова
Радиза-
Абдразаковна



Лауазымы/Должность: Бөлімшеңгерал
Жұмыс орны/Место работы: "Бөлімат ата"

"Думан-Мастер" ЖШС
Басшысы/
Директор ТОО "Думан-Мастер" Есенгалиева З.А.

Өрт техникалық минимум көлемінде
орт қауіпсіздігі саласында білім тексеру бойынша
біліктілік куәлігі/квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума

Білім тексеру туралы мәліметтер Сведения о проверках знаний

Өткізу күні Дата проведения	Хаттама № Протокол №	Қабылданған шешім туралы белгі Отметка о принятом решении	Комиссия төрағасының қолы. Подпись председателя комиссии	Келесі аттестаттау күні Дата следующей аттестации
05.01.2024	004/24	Тапсырды Сдал	М.О	04.01.2026
			М.О	
			М.О	
			М.О	

"Думан-Мастер"ЖШС
Оқуорталығы/Учебныйцентр
ТОО"Думан-Мастер"

Біліктілік куәлігі/Удостоверение 001/24 - 7



Сапарова
Гульбайра
Ешбаевна

Лауазымы/Должность: помощ по ху-хозе
Жұмыс орны/Место работы: "Бишкиатана"

"Думан-Мастер" ЖШС
Басшысы/
Директор ТОО "Думан-Мастер" Есенгалиев З.А.

Өрт техникалық минимум көлемінде
орт қауіпсіздігі саласында білім тексеру бойынша
біліктілік куәлігі/квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума


Білім тексеру туралы мәліметтер **Сведения о проверках знаний**

Өткізу күні Дата проведения	Хаттама № Протокол №	Қабылданған шешім туралы белгі Отметка о принятом решении	Комиссия төрағасының қолы Подпись председателя комиссии	Кезекті аттестаттау күні Дата следующей аттестации
05.01.2024	001/24	Тапсырды Сдал	М.О	05.01.2026
			М.О	
			М.О	
			М.О	

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ

ҚЫМБАТ АПА

"БЕКІТЕМІН"

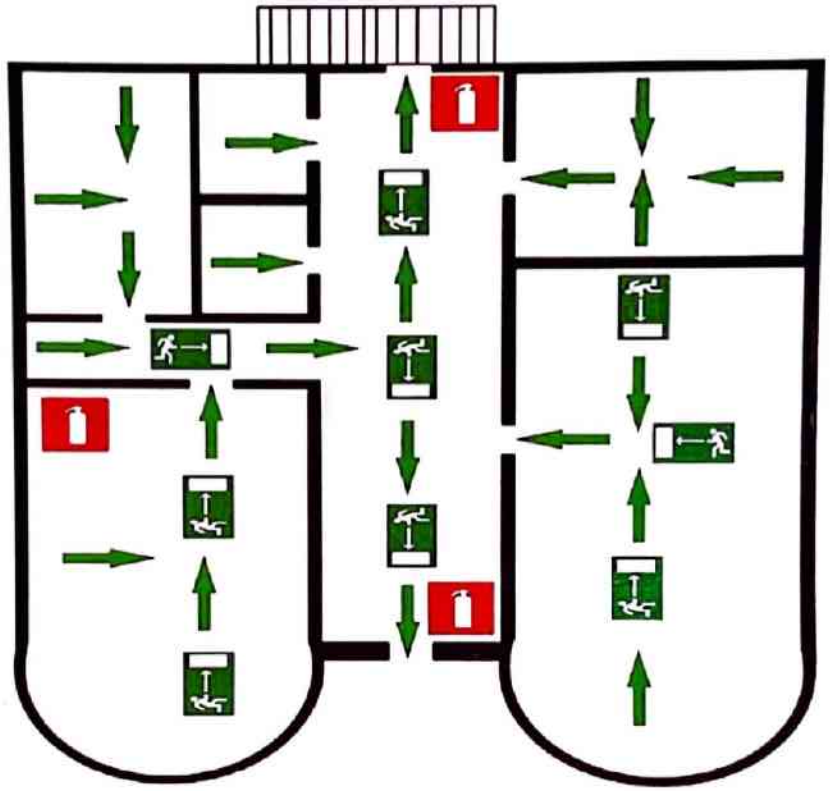

1-қабат

Жауапты тұлға _____

Назар аударыңыздар!
Өрт кезінде 101 нөміріне хабарласыңыз.

1. Жоспар бойынша бағдарлау
2. Өздеріңіздің тұрып жатқан жеріңізді анықтаңыз
3. Өрт кезінде инструкция бойынша әрекет етіңіз

Өрт кезіндегі әрекет.
Тыныштықты сақтаңыз!

1 Телефонмен 101 нөміріне қоңырау шалу!
- Нысана мекен-жайы
- Өрт шыққан жер
- Өзіңіздің тегіңіз

2 Адамдарды эвакуациялау
-Қозғалыс белгісі бойынша бағдарлау
-Жабірленушілерді алып шығу

3 Мүмкіндігінше өртке қарсы іс-шараларды жүзеге асыру
- Өрттен қорғану құрылғыларын пайдалану
- Қажетті жағдайда, тұрғылықты жерімен қатынасқа өту

Өрт кезіндегі әрекеттер.
Тыныштықты сақтау!

1 Телефонмен 101 нөміріне қоңырау шалу!
- Нысана мекен-жайы
- Не болды?
- Жабірленушілер табылды ма?
- Өзіңіздің тегіңіз

2 Өрт ошақтарын оқшаулау
-Өрттың ерішін тоқтату, болдырмау
- Қорғаныс құралдарын қолдану
- Өрт болған жерді белгілеу


3 Адамдарды эвакуациялау
- Жабірленушілерге көмек көрсету
- Жабірленушілерді өзімен бірге алып өтіп

Сымтетік
Өрт автоматикаларын жүйесін және қорғаныш тетігін қосу
Күштердің орны
Негізгі эвакуациялық жолдан шығу
Қосымша эвакуациялық жолдан шығу
Сіз осындасыз
Өрт крыны
Өрт сөндіргіш
Электроэнергиялар тетігі
Қозғалыс бағдары
Дәрігерлік көмек немесе қосымша Эвакуациялық жол
ҚЖ Қосымша жол
НЖ Негізгі жол

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ

ҚЫМБАТ АПА

"БЕКІТЕМІН"

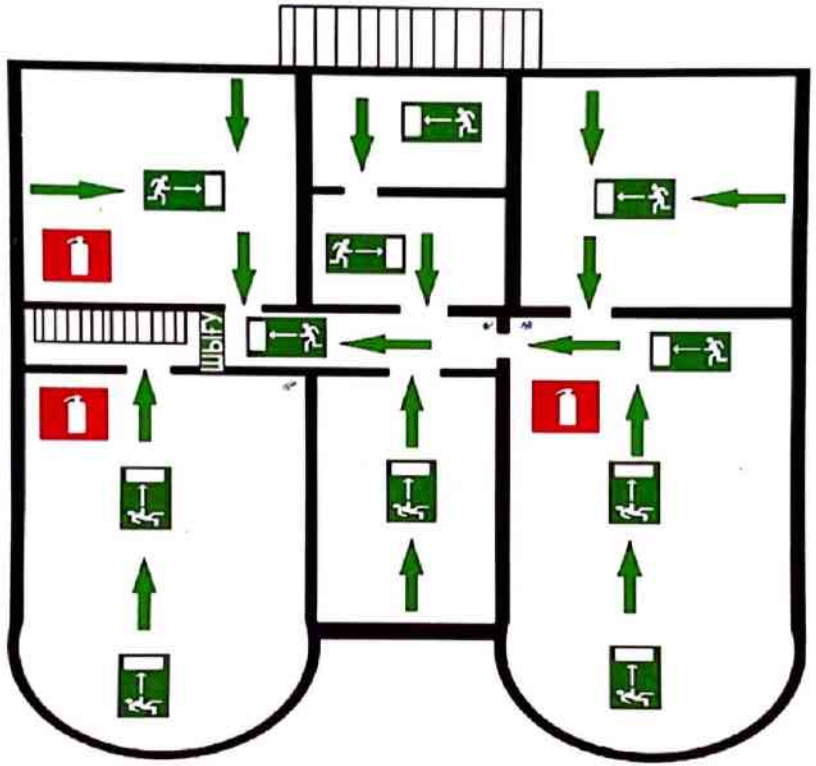

2-қабат

Жауапты тұлға _____

Назар аударыңыздар!
Өрт кезінде 101 нөміріне хабарласыңыз.

Жоспар бойынша бағдарлау
2. Өздеріңдің тұрғылықты жеріңізде әрекеттеріңіз
3. Өрт кезінде инструкция бойынша әрекет ету

Өрт кезіндегі әрекет.
Тыныштықты сақтаңыз!

1. Телефонмен 101 нөміріне қоңырау шалу! - Нысана мекен-жайы; - Өрт шыққан жер; - Өзіңіздің тегіңіз
2. Адамдарды эвакуациялау - Қозғалыс белгісі бойынша бағдарлау; - Жебіленушілерді алып шығу
3. Мүмкіндігінше өртке қарсы іс-шараларды жүзеге асыру - Өрттен қорғану құрылғыларын пайдалану; - Қоқысты жағудың, тұрғынпункт жерімен қамтамасыз ету.

Өрт кезіндегі әрекеттер.
Тыныштықты сақтау!

1. Телефонмен 101 нөміріне қоңырау шалу! - Нысана мекен-жайы; - Не болды?; - Жебіленушілер табылды ма?; - Өзің-кімдің тегің?
2. Өрт ошақтарын оқшаулау - Өрттің ерікін тоқтату бойынша; - Құрылыс құралдарын қолдану; - Өрт болған жерді белгілеу
3. Адамдарды эвакуациялау - Нысана мекен-жайы; - Жебіленушілерге алғашқы көмек көрсету; - Жебіленушілерді өзінен бөліп алып кету


Сөмкеге
Өрт автоматикаларының күйесін және құрылғы техник қызметіне хабарлау
Қолтаңбаңдың орны
Негізгі эвакуациялық жолдан шығу
Қосымша эвакуациялық жолдан шығу
Сіз осындасыз
Өрт крааны
Өрт сөндіргіш
Электр қозғалтқыштар тізбегі
Қозғалыс бағдары
Дәрігерлік көмек пункті қабылдау
Эвакуациялық жол
ҚЖ Қосымша жол
Негізгі жол

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ

"БЕКІТЕМІН"

ҚЫМБАТ АПА

Қосалқы ғимарат

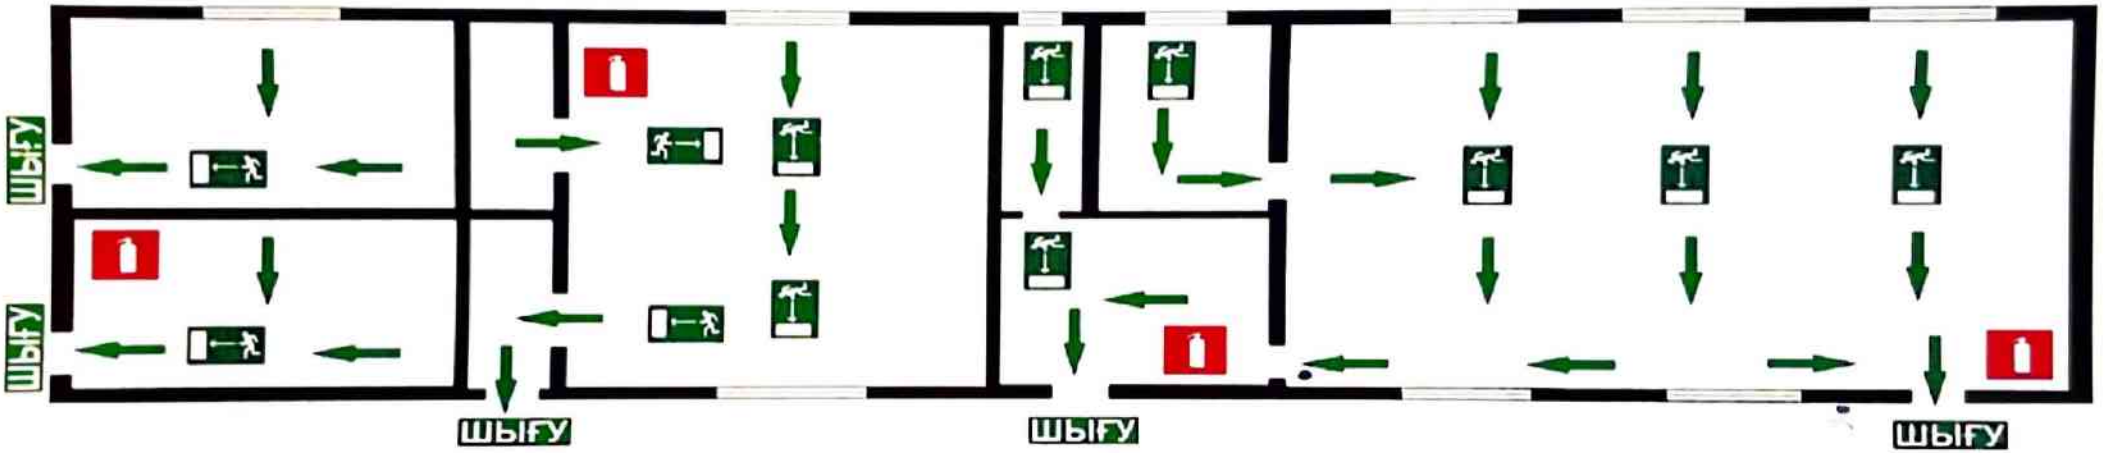

Жауапты тұлға _____

Назар аударыңыздар!
Өрт кезінде 101 нөміріне хабарласыңыз.

1. Жоспар бойынша бағдарлау
2. Өздеріңіздің тұрғылықты жеріңізді анықтаңыз
3. Өрт кезінде инструкция бойынша әрекет етіңіз

Өрт кезіндегі әрекет.
Тыныштықты сақтаңыз!

1 Телефонмен 101 нөміріне қоңырау шалу!
- Нысана мекен-жайы
- Өрт шыққан жер
- Өзіңіздің тегіңіз

2 Адамдарды эвакуациялау
-Қозғалыс белгісі бойынша бағдарлау
-Жабірленушілерді алып шығу

3 Мүмкіндігінше өртке қарсы іс-шараларды жүзеге асыру
- Өрттен қорғану құрылғыларын пайдалану
- Қажетті жағдайда,тұрғынжайды жедел қамтамасыз ету

Өрт кезіндегі әрекеттер.
Тыныштықты сақтау!

1 Телефонмен 101 нөміріне қоңырау шалу!
- Нысана мекен-жайы
- Не болды?
- Жабірленушілер табылды ма?
- Өзіңіздің тегіңіз

2 Өрт ошақтарын оқшаулау
-Өрттің ауқымын тоқтату, бағдарлау
- Қорғаныс құралдарын қолдану
- Өрт болған жерді бағалау

3 Адамдарды эвакуациялау
- Сөлп бойынша бағдар алу
- Жабірленушілерге алғашқы көмек көрсету
- Жабірленушілерді өзімен бірге алып шығу

Сымтетік
Өрт автоматикаларының күйінен және құралына тепген кию қосу
Кілттердің орны
Негізгі эвакуациялық жолдан шығу
Қосымша эвакуациялық жолдан шығу
Сіз осындасыз
Өрт крааны
Өрт сөндіргіш
Электрсөндіргіштер тегіні
Қолмалық бағдары
Дәрілік қорап немесе қабаршы
Эвакуациялық жол
Қ.Ж Қосымша жол
Н.Ж Негізгі жол
